



ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ

2018 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

TEMMUZ 2018-ISPARTA

SUNUŐ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleřmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına baėlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doėrultusunda idaremizin 2018 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Mahmut ZADEOĐLU
Genel Sekreter

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
1. Personel Giderleri.....	6
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4.Faiz Giderleri.....	9
5. Cari Transferler.....	10
6. Sermaye Giderleri.....	11
7. Sermaye Transferleri	12
8. Yedek Ödenekler	13
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C. Finansman	15
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	16
A. Biten Proje ve Faaliyetler.....	16
B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler	29
III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	48
1- Personel Giderleri.....	49
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	49
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49
4- Faiz Giderleri	49
5- Cari Transferler.....	49
6- Sermaye Giderleri.....	49
7- Sermaye Transferleri	49
8- Yedek Ödenekler	49
IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	53
A-Devam Edecek Projeler	53
B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler.....	72
V- EKLER.....	90
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	91
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	92


I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2017 yılı başlangıç gider bütçesi 72.000.000,00 TL olup, izleyen yıl bütçesi için %41,7 büyüme öngörülmüştür. Bu doğrultuda 2018 mali yılına ait bütçe giderlerinde kullanılmak üzere başlangıç bütçesi ile toplam 102.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.


2017 yılında kurum dışı aktarmalarla eklenen tahsisi mahiyette ödeneklerden harcamalarla birlikte toplam 179.197.172,00 TL bütçe gideri gerçekleşmesi olmuştur.

2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi					
Bütçe Tertibi	2017 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmeleri		2017 Başlangıç Ödeneği	2018 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı %
	Öz Kaynaklı (5)	Diğer (8)			
01-Personel Giderleri	14.349.262	29.107.678	15.992.130	17.756.420	11,0
02-SGK Devlet Primi Giderleri	2.397.542	5.059.471	2.369.860	2.715.970	14,6
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.529.674	4.503.803	19.051.660	22.105.485	16,0
04-Faiz Giderleri	685.695	0	1.060.750	1.499.650	41,4
05-Cari Transferler	4.503.031	154.878	4.893.400	5.761.425	17,7
06-Sermaye Giderleri	49.958.044	46.229.608	23.209.700	46.351.050	99,7
07-Sermaye Transferleri	2.518.237	200.250	750.000	810.000	8,0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.770.090	0	4.672.500	5.000.000	7,0
Toplam	93.941.484	85.255.688	72.000.000	102.000.000	41,7

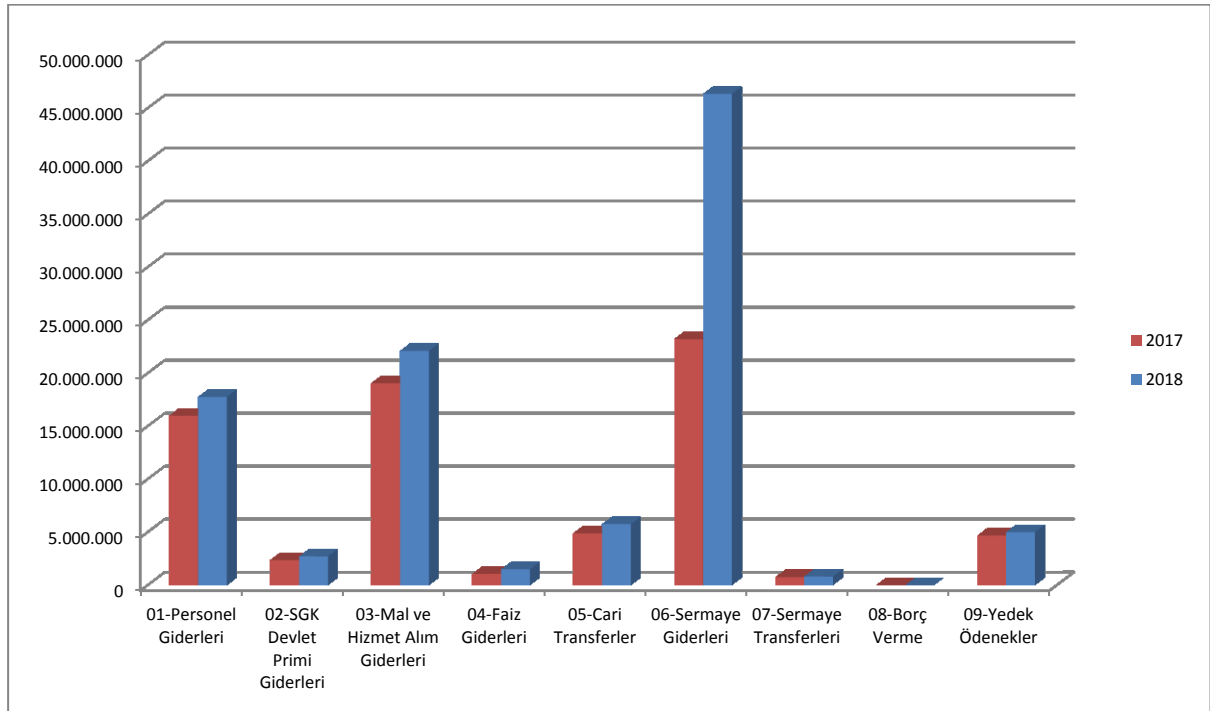

2017 mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleřmeleri, Bütçe Giderlerinin Geliřimi Tablosu'nda da görüldüğü gibi toplam 61.103.260,00 TL olarak gerçekleřmiştir. 2017 yılsonu gerçekleřmelerinin %34,1'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleřmiştir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 101.787.980,00 TL olmuřtur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleřme toplamaları karşılařtırıldığında, giderlerde %66,6 oranında bir artış olduđu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerinin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleřmelerine iliřkin ayrıntılı veriler ařağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir.


2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleřmeleri							
Bütçe Tertibi	2017 Yıl Sonu Gider Gerçekleřmeleri	2018 Ocak-Haziran Ödeneđi	Gider Gerçekleřmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Personel Giderleri	43.456.940	32.132.063	20.248.034	21.580.792	46,6	67,2	6,6
02-SGK Devlet Primi Giderleri	7.457.013	5.380.449	3.177.760	3.919.962	42,6	72,9	23,4
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.033.477	24.825.037	10.898.474	11.330.833	45,3	45,6	4,0
04-Faiz Giderleri	685.695	1.499.650	332.302	332.934	48,5	22,2	0,2
05-Cari Transferler	4.657.908	5.771.484	2.509.832	3.105.577	53,9	53,8	23,7
06-Sermaye Giderleri	96.187.652	184.185.969	23.471.861	60.700.356	24,4	33,0	158,6
07-Sermaye Transferleri	2.718.487	840.000	464.998	817.525	17,1	97,3	75,8
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.770.090	3.806.500	895.047	1.153.500	23,7	30,3	28,9
Toplam	179.197.172	258.441.151	61.103.260	101.787.980	34,1	39,4	66,6

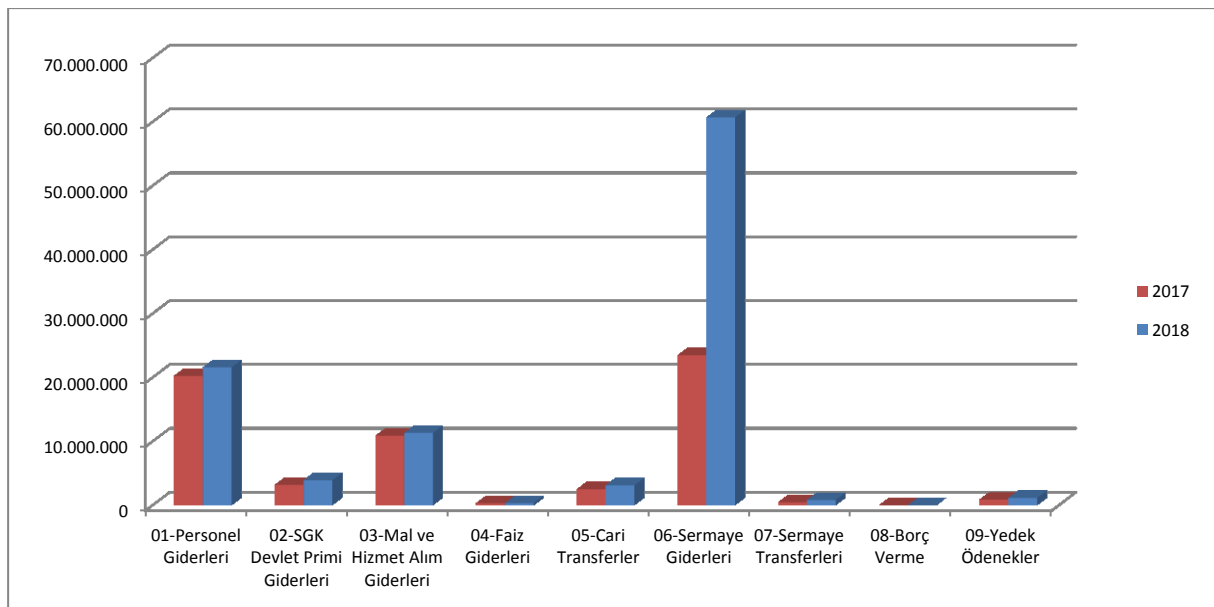

1. Personel Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.248.034,00 TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.332.757,00 TL artışla 21.580.792,00 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %6,6 olarak gerçekleşmiştir. Mukayese edilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	3.655.868	4.004.830	348.963	9,5
Şubat	3.174.550	3.474.814	300.265	9,5
Mart	2.539.982	3.331.520	791.538	31,2
Nisan	3.045.188	3.078.210	33.022	1,1
Mayıs	4.280.156	4.301.532	21.376	0,5
Haziran	3.552.292	3.389.886	-162.407	-4,6
Toplam	20.248.034	21.580.792	1.332.757	6,6

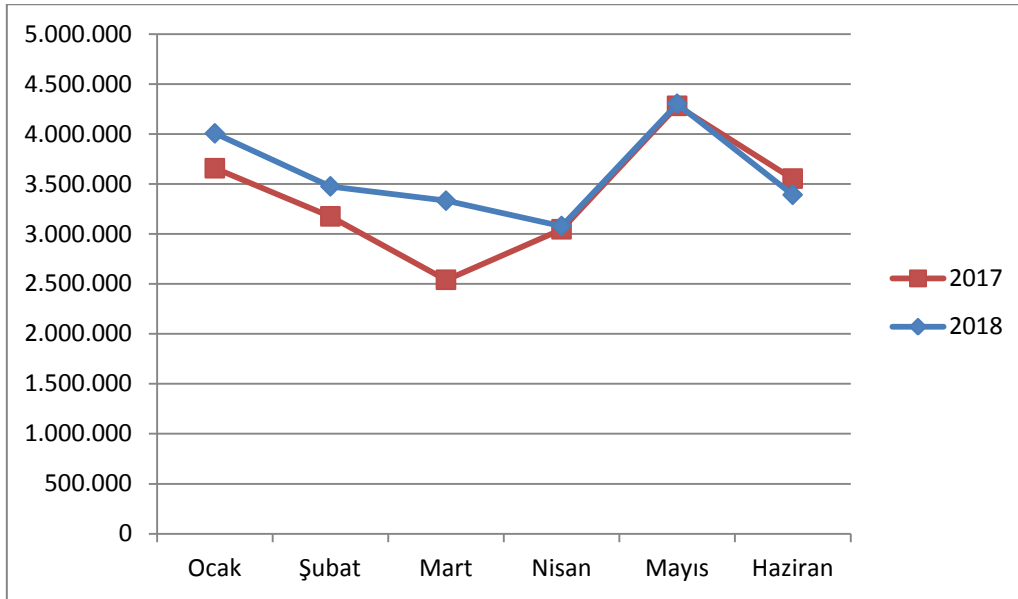

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.177.760,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 742.203,00 TL artışla 3.919.962,00 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %23,4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	520.337	681.852	161.515	31,0
Şubat	416.733	593.257	176.523	42,4
Mart	372.234	573.670	201.436	54,1
Nisan	460.149	572.168	112.019	24,3
Mayıs	704.579	823.253	118.674	16,8
Haziran	703.727	675.763	-27.965	-4,0
Toplam	3.177.760	3.919.962	742.203	23,4

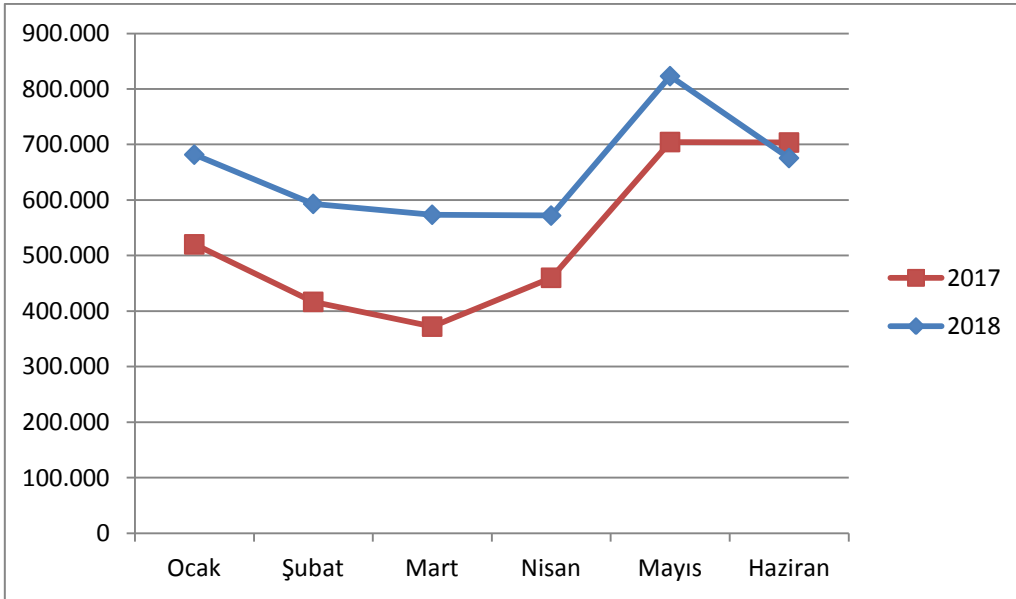

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.898.474,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 432.359,00 TL artışla 11.330.833,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %4,0 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	1.678.140	426.595	-1.251.544	-74,6
Şubat	2.043.840	1.832.661	-211.179	-10,3
Mart	2.033.644	2.648.369	614.725	30,2
Nisan	1.855.757	1.922.180	66.423	3,6
Mayıs	1.445.390	2.781.824	1.336.434	92,5
Haziran	1.841.703	1.719.202	-122.500	-6,7
Toplam	10.898.474	11.330.833	432.359	4,0

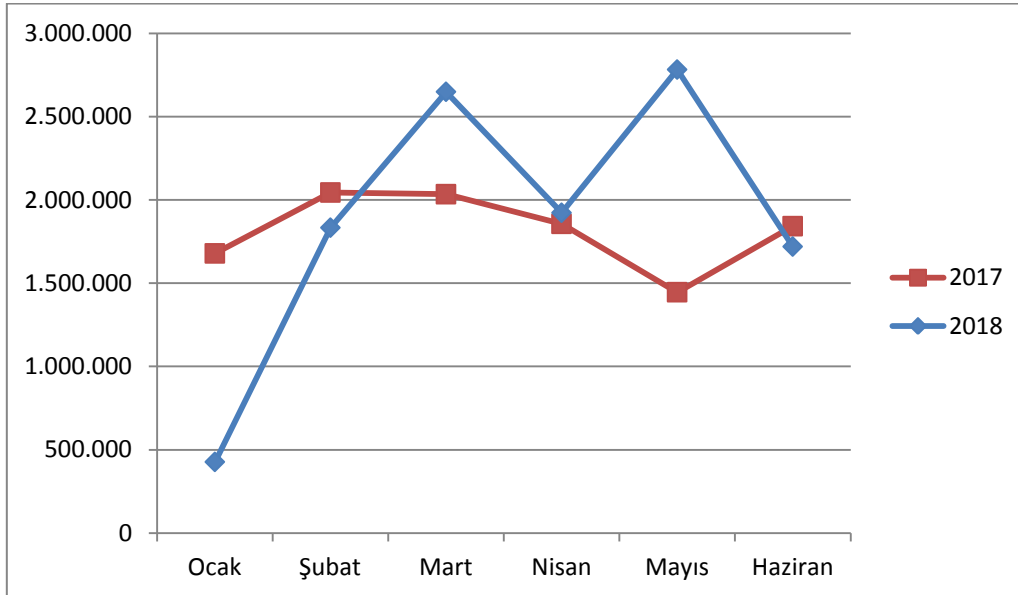


4.Faiz Giderleri

İdaremizce 203 köyde uygulanan meydan düzenleme projesi için İller Bankası'ndan kullanılan kredi ile 6360 sayılı Kanun gereğince devralınan bir adet içme suyu projesi kredisi için 2017 ve 2018 yıllarında tahakkuk eden faiz giderleri İller Bankası'nca idaremizin genel bütçe vergi gelirleri payından aylık olarak mahsup edilmiştir.

2017 ve 2018 mali yılları Ocak-Haziran dönemlerinde yapılan faiz ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Faiz Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	53.233	57.528	4.296	8,1
Şubat	52.888	56.721	3.832	7,2
Mart	63.874	55.907	-7.967	-12,5
Nisan	51.016	55.087	4.072	8,0
Mayıs	50.443	54.261	3.818	7,6
Haziran	60.847	53.429	-7.418	-12,2
Toplam	332.302	332.934	632	0,2

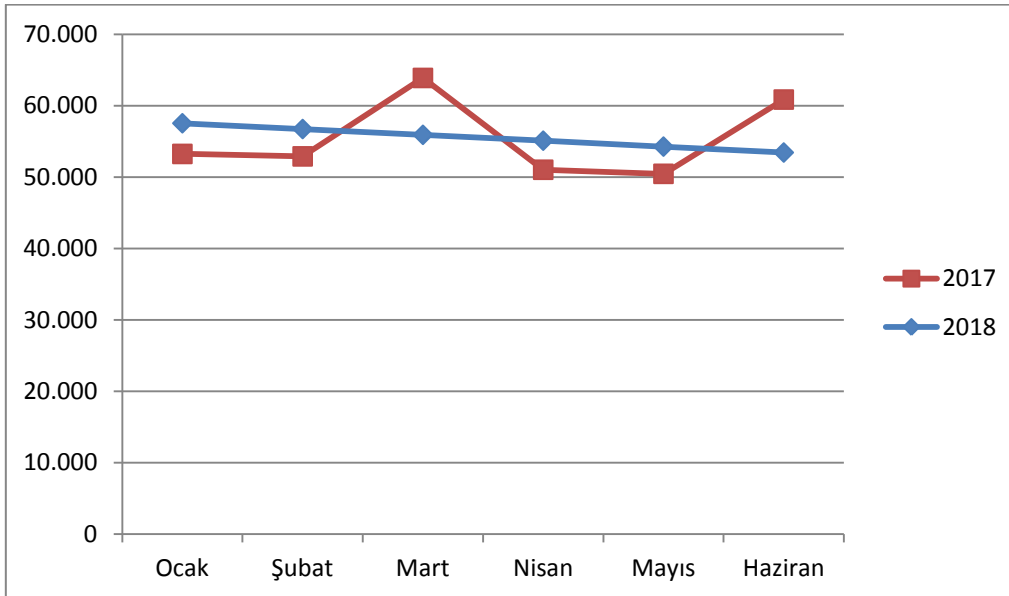

5. Cari Transferler

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.509.832,00 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 595.746,00 TL artışla 3.105.577,00 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarındaki artış %23,7 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı cari transfer harcamalarının %11,3'lük kısmı SGK'na yapılan ödemelerden, %87,5'lik kısmı gelirlerden diğer idarelere ayrılan paylardan, %1,2'lik kısmı memurların öğle yemeğine yardım ödemelerinden oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarının aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Cari Transferler				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	389.503	502.336	112.833	29,0
Şubat	161.454	1.136.089	974.635	603,7
Mart	504.312	133.929	-370.382	-73,4
Nisan	116.748	990.296	873.548	748,2
Mayıs	822.175	116.231	-705.944	-85,9
Haziran	515.639	226.696	-288.944	-56,0
Toplam	2.509.832	3.105.577	595.746	23,7



6. Sermaye Giderleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.471.861,00 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 37.228.495,00 TL artışla 60.700.356,00 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %158,6 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Sermaye Giderleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	821.852	6.658.902	5.837.050	710,2
Şubat	2.017.364	5.471.699	3.454.335	171,2
Mart	2.693.358	8.703.927	6.010.569	223,2
Nisan	5.361.399	7.231.414	1.870.015	34,9
Mayıs	5.730.912	17.853.908	12.122.996	211,5
Haziran	6.846.976	14.780.506	7.933.530	115,9
Toplam	23.471.861	60.700.356	37.228.495	158,6



7. Sermaye Transferleri

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 464.998,00 TL olan sermaye transferi harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 352.527,00 TL artışla 817.525,00 TL olmuştur. Sermaye transferleri harcamalarındaki artış %75,8 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sermaye transferi harcamalarının %98,8'i köy tüzel kişiliklerine ve mahalli idare birliklerine yapılan yardımlardan, %1,2'si idarece kurulmuş olan şirkete ödenen sermaye giderinden oluşmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye transferi harcamalarının aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Sermaye Transferleri				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	0	45.000	45.000	0,0
Şubat	20.000	182.525	162.525	812,6
Mart	15.000	50.000	35.000	233,3
Nisan	0	510.000	510.000	100,0
Mayıs	315.000	10.000	-305.000	-96,8
Haziran	114.998	20.000	-94.998	-82,6
Toplam	464.998	817.525	352.527	75,8

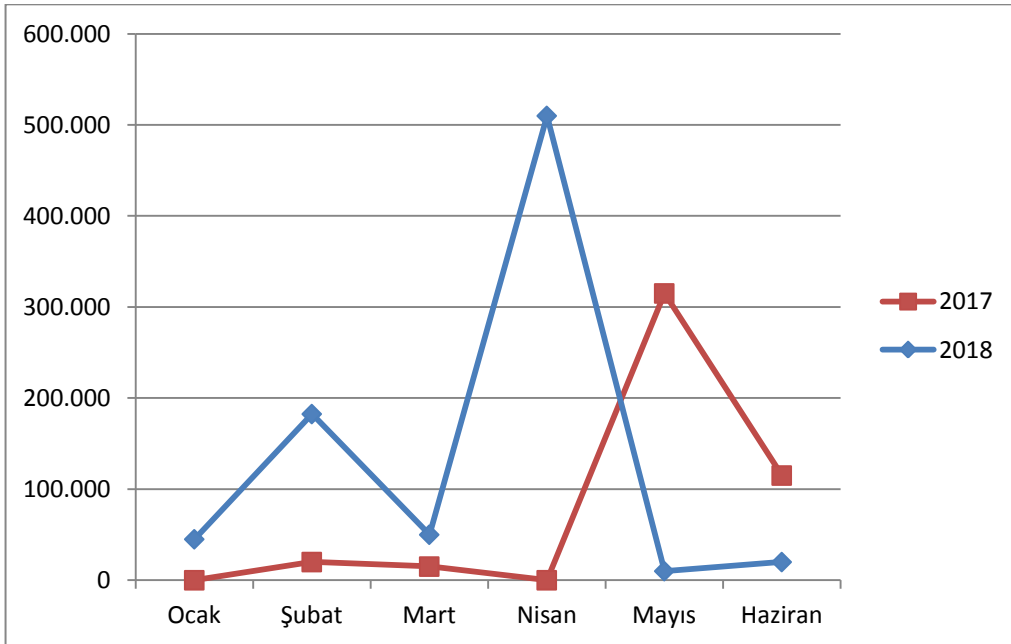

8. Yedek Ödenekler

Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 895.047,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarmalar 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 258.453,00 TL artışla 1.153.500,00 TL olmuştur. Yedek ödeneğin kullanımındaki artış oranı %28,9 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerde yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları aylar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.


2017-2018 Yedek Ödeneklerin Kullanımı				
Aylar	2017	2018	Değişim Tutarı	Değişim Oranı %
Ocak	200.000	10.000	-190.000	-95,0
Şubat	0	0	0	0,0
Mart	30.000	123.500	93.500	311,7
Nisan	65.047	0	-65.047	-100,0
Mayıs	500.000	1.000.000	500.000	100,0
Haziran	100.000	20.000	-80.000	-80,0
Toplam	895.047	1.153.500	258.453	28,9



B. Bütçe Gelirleri

İdaremizin 2017-2018 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 yılında planlanan toplam bütçe geliri 100.000.000,00 TL olup, Haziran sonu itibariyle (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 46.209.460,00 TL olmuştur. 2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir türlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda ve rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri							
Gelir Ekonomik Kod	2017 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir	2018 Planlanan Gelir ve Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar	Gelir Gerçekleşmeleri				Artış Oranı %
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		
			2017	2018	2017	2018	
01-Vergi Gelirleri	198.125	150.000	77.164	66.967	38,9	44,6	-13,2
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.485.133	1.551.000	578.480	1.026.314	39,0	66,2	77,4
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	78.488.931	46.209.460	30.538.913	46.209.460	38,9	100,0	51,3
05-Diğer Gelirler	94.278.713	96.109.000	47.130.977	55.480.063	50,0	57,7	17,7
06-Sermaye Gelirleri	320.831	2.190.000	0	0	0,0	0,0	0,0
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	339.999	0	5.320	807.568	1,6	0,0	0,0
Toplam	174.431.735	146.209.460	78.320.213	101.975.237	44,9	69,7	30,2




C. Finansman

İdaremizin 2018 yılı başlangıç bütçesinde 100.000.000,00 TL bütçe geliri ve 10.000.000,00 TL borçlanma karşılığında 102.000.000,00 TL bütçe gideri ve 8.000.000,00 TL borç ödemesi planlanarak gelir-gider denkliliği öngörülmüştür.

Yıl içinde duyulan ihtiyaca binaen il genel meclisince alınan kararlar ile 2017 yılından devreden 19.500.000,00 TL serbest nakit karşılığında birimlerimize 19.500.000,00 TL ek ödenek verilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bütçe gelirleri ile yapılan bütçe giderleri ve borç ödeme bilgileri sonucu oluşan finansman dengesi aşağıda gösterilmiştir.

2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Durumu							
	Önceki Yılda Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Gerçekleşen	Gerçekleşme Oranı %
		Başlangıç	Yıl içinde Yapılan İlave Planlama				
Tahsisli Mahiyette Nakit	90.731.691			46.209.460	136.941.151	136.941.151	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		100.000.000			100.000.000	55.765.776	55,8
Borçlanma		10.000.000			10.000.000		0,0
Ek Gelir (Serbest Nakit)			19.500.000		19.500.000	19.500.000	100,0
Finansman Toplamı	90.731.691	110.000.000	19.500.000	46.209.460	266.441.151	212.206.928	79,6
Tahsisli Mahiyette Ödenekler/Giderler	78.881.479			46.209.460	125.090.940	52.340.706	41,8
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	11.850.211	102.000.000	19.500.000		133.350.211	49.447.274	37,1
Borç Ödeme		8.000.000			8.000.000	4.460.971	55,8
Ödenekler/Giderler Toplamı	90.731.691	110.000.000	19.500.000	46.209.460	266.441.151	106.248.951	39,9
Finansman Dengesi						105.957.976	

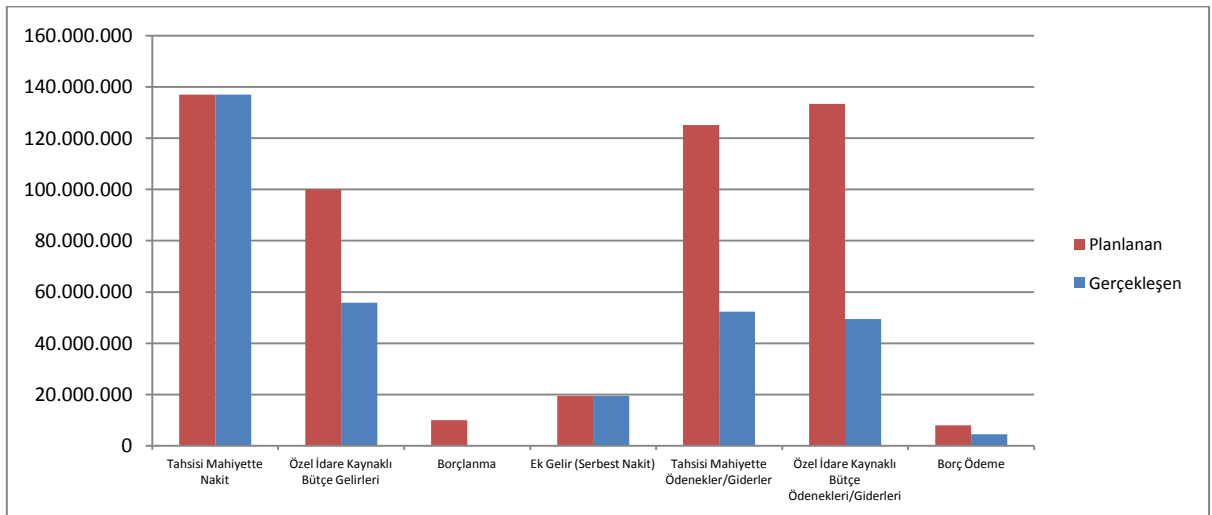

II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. Biten Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.
Yeri	Merkez
Sektörü	TARIM-Sulama
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	40.867,20 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	30.01.2018 - 23.02.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İçişleri Bakanlığı
Amacı	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Açıklama	PVC Borular İdaremize 23.02.2018 teslim edildi.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta-Gönen-Gölbaşı YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Gönen-Gölbaşı
Sektörü	TARIM-Sulama
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.132.800,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	04.10.2017 - 01.06.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 95
Fiziki Gerçekleşme	% 98
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Açıklama	İnşaat Tamamlandı. Geçici Kabulü Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Keçiborlu Ardıçlı 1.Kısım YAS Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi Yapım İşi.
Yeri	Keçiborlu Ardıçlı
Sektörü	TARIM-Sulama
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	630.120,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	01.12.2017 - 29.06.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 93
Fiziki Gerçekleşme	% 99
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
Amacı	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Açıklama	İnşaat Tamamlandı. Geçici Kabulü Yapılacak.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Özel İdaresi Güneş Enerji Santrali (GES) Çağrı Mektubu/Bağlantı Uygunluk Görüşü Alınması İşi
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	13.850,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Barla Köyü Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Hazırlanması Hizmet Alım İşi
Yeri	Barla Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	11.328,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Direkli Köyü 1500 M2 Kilitli Parke Taşı Alım İşi
Yeri	Merkez Direkli
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	26.373,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta İl Özel İdaresi Sınırları İçerisinde Bulunan Köylere Piknik Masası Alım İşi
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	7.965,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2 adet Çocuk Oyun Parkı Alınması İşi
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	18.290,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsala planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büyükhacılar Davraz Kayak Merkezi Piknik Alanı Pergole Saç-Profili Malzemesi Alımı
Yeri	Merkez Büyükhacılar
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	23.052,18 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsala planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büyükhacılar Davraz Kayak Merkezi Piknik Alanı Pergole İçin Krom, Şingil Ve Osb Kaplama Malzemeleri Alımı
Yeri	Merkez Büyükhacılar
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	15.065,59 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsala planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş bitti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Ş.Karaağaç Ördekçi Köyü, Yakaemir Köyü, Senirkent Karip Köyü İçme Suyu Sondaj Kuyusu Açma Yapım İşi
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Ördekçi ve Yakaemir Köyleri, Senirkent İlçesi Karip Köyü
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	109.150,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	26.10.2017-26.01.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Aksu Terziler Köyü İsale Hattı Yenileme Yapım İşi
Yeri	Aksu İlçesi Terziler Köyü
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	68.440,00
Başlama – Bitiş Tarihi	16.01.2018-16.04.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Çukur Köyü İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi
Yeri	Merkez İlçe Çukur Köyü
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	81.420,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	20.12.2017-05.03.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkikaraağaç Yeniköy Köyü Kanalizasyonu Yapım İşi
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Yeniköy Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	706.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.09.2017-02.01.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkikaraağaç Beyköy Köyü İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Beyköy Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	43.070,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.12.2017-28.04.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Merkez Yakaören Köyü Kanalizasyon Şebekesi Yenileme ve İlave Projesi-Isparta Merkez Gelincik Köyü İlave Kanalizasyon Projesi
Yeri	Merkez İlçe Yakaören ve Gelincik Köyleri
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	122.130,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.12.2017-23.04.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gönen Gölbaşı Köyü İlave Kanalizasyon Yapım İşi
Yeri	Gönen İlçesi Gölbaşı Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	94.400,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	18.04.2018-20.06.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yeri	Isparta
Sektörü	Kamu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	243.056,4 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	17.05.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Olası bir deprem sonucunda profesyonel ekipler olay yerine gelinceye kadar mevcut imkânlar ile vatandaşların kurtarma faaliyetlerinde bulunabilmesi
Açıklama	İlimizde meydana gelebilecek olası bir deprem sonucunda arama ve kurtarma faaliyetleri ile temel ilkyardım tedavisinde kullanılmak üzere tespit edilen malzemeleri içeren müdahale konteynirini alarak ilimiz ve ilçelerine yerleştirmek.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yeri	Isparta
Sektörü	Kamu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	150.270,6 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	10.05.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak
Açıklama	O Kahraman Benim Projeleri kapsamında İlimizde afet eğitimleri ile duyarlılığı artırmak ve farkındalık yaratmak, afet ve sivil savunma gönüllüleri sayısını artırmak suretiyle afet yönetiminde zarar azaltmak amacıyla eğitim ve promosyon materyalleri alımı

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yeri	Isparta
Sektörü	Kamu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	49.678,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	10.05.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Arama ve Kurtarma araçlarının güçlendirilmesi
Açıklama	Arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araçlara çeki vinci ile çeki demiri takılıp projelendirilip arama ve kurtarmada daha verimli ve etkin hizmet etmek amacıyla kurtarma araçlarının güçlendirilmesi

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yeri	Isparta
Sektörü	Kamu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	96.820,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.06.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	Arama ve Kurtarma potansiyelinin güçlendirilmesi
Açıklama	Doğada arama ve kurtarma potansiyelinin geliştirilmesi, kurtarma malzemelerinin güçlendirilmesi

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	24 Derslikli Sosyal Bilimler Lisesi
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.498.528,33 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	24 Derslikli Ortaokul Yapımı.
Yeri	Eğirdir Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.914.258,29 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Bakanlık-Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu İlçesi Kozluca Köyü Altyapıdan Bozulan Kilit Parke Taşlarının Sökülüp Tamir Edilmesi İşi
Yeri	Keçiborlu İlçesi Kozluca Köyü
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	26.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkikaraağaç Başdeğirmen Köyü İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı ve Güneş Enerjili Sistem Kurulması İnşaatı
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Başdeğirmen Köyü
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	85.550,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	25.12.2017-22.02.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Şarkikaraağaç Yassıbel Köyü İçmesuyu Pompası ve GES Kurulması Yapım İşi
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Yassıbel Köyü
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	69.030,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.01.2018-03.03.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	

B- Devam Eden Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	I. Kat Asfalt Kaplama (8 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.075.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	II. Kat Asfalt Kaplama (40 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	3.225.600,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	-
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	BSK Kaplama (31 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	16.179.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.05.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 40
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Bitümlü Sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ihtiyacı Akaryakıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	2.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2018 – 31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 96
Fiziki Gerçekleşme	% 50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Bitümlü Sıcak karışım kaplama (BSK) ve I. ve II. Kat Sathi Kaplama ve Stabilize çalışmalarında çalıştırılacak Asfalt Plent Opr. Finişer Opr. ve Silindir Opr. Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018 – 31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 47
Fiziki Gerçekleşme	% 47
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım (Yama)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 36
Fiziki Gerçekleşme	% 36
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	1.398,6 km asfalt köy yolunda 509 km asfalt küçük on. Çalış. yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ihtiyacı Akaryakıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	1.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018 – 31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 40
Fiziki Gerçekleşme	% 40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	300.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 8
Fiziki Gerçekleşme	% 8
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	24.910,07 TL sanat yapıları malzeme alımı yapıldı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Trafik İşaret Levha Çalışmaları
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	% 86
Fiziki Gerçekleşme	% 86
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	172.677,94 TL trafik işaret ve levha malzemeleri alımı yapıldı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Merkez Gülevler Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal / Hizmet / Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	934.137,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%53
Fiziki Gerçekleşme	%53
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma yapılamayan %47'lik kısım için dava açıldı

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Muzaffer Türkeş Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal / Hizmet / Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	3.411.587,23 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%84
Fiziki Gerçekleşme	%84
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma çalışmaları %84 tamamlandı. Kamulaştırma yapılamayan %16'lık kısmı ile ilgili Dava açılması için İl Özel İdaresine hazırlanan dosya gönderildi.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) TEDAŞ Onayı Ve Bağlantı Antlaşması İmzalanması
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	22.420,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İdareimiz hizmet birimlerine bilgisayar yazılımı alımları
Yeri	ISPARTA
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	100.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%11
Fiziki Gerçekleşme	%11
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İdareimiz hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım ve lisansların temini
Açıklama	İdareimizde kullanılmakta olan veya ihtiyaç duyulan programların alımı ve güncellenmesi

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Atabey Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.653.920,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%63
Fiziki Gerçekleşme	%63
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.599.200,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%52
Fiziki Gerçekleşme	%52
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Gelendost Anaokulu Yapımı.
Yeri	Gelendost Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.326.960,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%52
Fiziki Gerçekleşme	%52
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Çünür 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.830.961,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%81
Fiziki Gerçekleşme	%81
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Halikent 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.938.400,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%90
Fiziki Gerçekleşme	%90
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Modernevler 24 Derslikli Gazi Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez.
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.621.172,13 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%97
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Özel İdare/Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	12 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Sütçüler Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	5.574.320,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%7
Fiziki Gerçekleşme	%7
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Şehit Süleyman Kalkan 12 Derslikli Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Yalvaç Sücüllü
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal Hizmet / Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.810.685,53 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%75
Fiziki Gerçekleşme	%75
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Gülevler Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal / Hizmet / Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	934.137,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%53
Fiziki Gerçekleşme	%53
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma yapılamayan %47'lik kısım için dava açıldı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Muzaffer Türkeş Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal / Hizmet / Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	3.411.587,23 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Nakdi(Parasal) Gerçekleşme	%84
Fiziki Gerçekleşme	%84
Kaynağı(Özel İdare/İller Bankası /Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma çalışmaları %84 tamamlandı. Kamulaştırma yapılamayan %16'lık kısmı ile ilgili Dava açılması için İl Özel İdaresine hazırlanan dosya gönderildi.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Birliklere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü	DKH-SY-Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	820.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%98
Fiziki Gerçekleşme	%98
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	21 adet iş için KHGB' ne yardım yapılmıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	8.211.285,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2016-28.06.2019
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%73
Fiziki Gerçekleşme	%73
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sarem Limnolojik Araştırmalar Merkezi Yapım İşi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	12.380.560,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.09.2017-01.05.2020
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%6
Fiziki Gerçekleşme	%6
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Yapımı Devam etmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Anıt Mezarı Yapım İşi
Yeri	Atabey
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.544.920,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	13.12.2017-10.06.2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%62
Fiziki Gerçekleşme	%85
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor. Son hak ediş ödeneği Bakanlıkça aktarılmamıştır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni Mekanik Tesis Yapımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması İle Ek Trafo Tesislerinin Yapılması İşi
Yeri	Isparta-Davraz
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	42.362.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	23.02.2018-23.01.2020
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%6
Fiziki Gerçekleşme	%6
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2011-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%40
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	<p>07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I. Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL. süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir.07.09.2015-06.10.2015 tarihleri arası III. askı yapılmıştır. bu durum İdaremizce değerlendirilecektir. Bu nedenle 1/25000 ÇDP idaremizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, iş devam ediyor.</p> <p>(Ayrıca Bakanlığın görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.)</p> <p>1/100.000 ölçekli ÇDP'nin kesinleşmesi akabinde taslak plan, İl Genel Meclisi ve Isparta Belediye Meclisine sunuldu. Belde Belediyelerinin görüşleri İl Genel Meclisi tarafından yeniden alındı. Düzeltmeler yapıldı Mayıs 2017 meclisince değişiklikler istendi. İş devam ediyor.</p>

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı I. Grup Isparta İli Merkez-Atabey-Gönen-Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi (55 Köy)
Yeri	Merkez-Atabey-Gönen-Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent İlçelerine Bağlı Köyleri (55 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.552.467,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı II. Grup Isparta İli Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(71 Köy)
Yeri	Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köyleri(71 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.648.932,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%15
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı IV. Grup Isparta İli Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(37 Köy)
Yeri	Yalvaç İlçesine Bağlı Köyler(37 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.601.326,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Süçüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi
Yeri	Yalvaç/Süçüllü Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	105.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%40
Fiziki Gerçekleşme	%93
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	24.05.2018 tarihinde askıya çıktı. İtirazlar değerlendiriliyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Özgüney - Özbayat İlave Revizyon İmar Planı
Yeri	Yalvaç/Özgüney - Özbayat
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%20
Fiziki Gerçekleşme	%95
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Mecliste onaylandı ve imar planı kesinleşti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir İlçesi Barla Köyü 5334 Parselde Bulunan Yapı İçin Rölöve, Restorasyon Elektrik Ve Makina Projeleri Hazırlanması İş
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	EĞİTİM-Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	38.940,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%90
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) İmar Planı Yapımı
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	19.765,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İmar planı askıda iş devam ediyor.


Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) TEDAŞ Onayı Ve Bağlantı Antlaşması İmzalanması
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	22.420,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor.

III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2018 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Tahminleri					
Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği + Ocak-Haziran Ek Ödeneği	Temmuz-Aralık Ek Ödenek Tahmini	Ocak-Haziran Gerçekleşen Harcamaları	Temmuz-Aralık Harcama Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
01-Personel Giderleri	32.132.063	18.798.677	21.580.792	27.297.078	96,0
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.380.449	3.589.819	3.919.962	4.874.418	98,0
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.825.037	740.400	11.330.833	10.482.680	85,3
04-Faiz Giderleri	1.499.650	0	332.934	851.646	79,0
05-Cari Transferler	5.771.484	218.739	3.105.577	2.400.142	91,9
06-Sermaye Giderleri	184.185.969	33.732.337	60.700.356	76.612.079	63,0
07-Sermaye Transferleri	840.000	141.030	817.525	163.505	100,0
08-Borç Verme		0	0	0	0,0
09-Yedek Ödenekler	3.806.500	0	1.153.500	3.771.500	98,5
Toplam	258.441.151	57.221.003	101.787.980	122.681.548	71,1

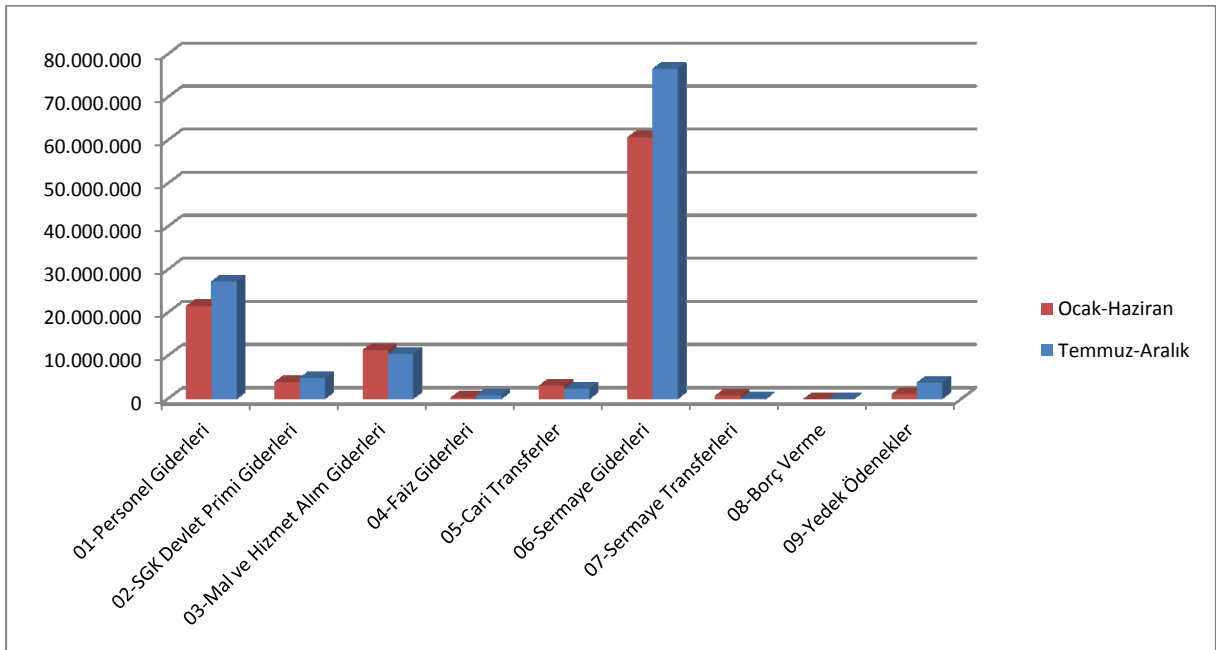

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 21.580.792,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık 27.297.078,00 TL'yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %96,0'sı olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.919.962,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 4.874.418,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin % 98,0'i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 11.330.833,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 10.482.680,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %85,3'ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 332.934,00 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 851.646,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %79,0'u olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.105.577,00 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 2.400.142,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %91,9'u olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 60.700.356,00 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 76.612.079,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %63,0'ü olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 817.525,00 TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 163.505,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %100'ü olacağı tahmin edilmektedir.


8- Yedek Ödenekler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 1.153.500,00 TL olan yedek ödenek kullanımının Temmuz-Aralık 2018 döneminde 3.771.500,00 TL olması beklenmektedir. Yedek Ödeneklerin yılsonu gerçekleşmesinin 2018 yılı bütçe ödeneğinin %98,5'i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminin gerçekleşme beklentileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


2018 Yıllı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Tahminleri				
Gelir Ekonomik Kod	2018 Planlanan Gelir	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini	Değişim Oranı %
01-Vergi Gelirleri	150.000	66.967	83.709	25,0
02-Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0,0
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.551.000	1.026.314	625.341	-39,1
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	46.209.460	51.339.573	11,1
05-Diğer Gelirler	96.109.000	55.480.063	55.127.002	-0,6
06-Sermaye Gelirleri	2.190.000	0	0	
08-Alacaklardan Tahsilât	0	0	0	0,0
09-Red ve İadeler (-)	0	807.568	0	-100,0
Toplam	100.000.000	101.975.237	107.175.625	5,1



C. Finansman

Temmuz-Aralık dönemi finansman durumu beklentileri aşağıda gösterilmiştir. Yılsonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir.

2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini									
	Önceki Yıldan Devir	Planlanan		Ocak-Haziran Döneminde Ek Olarak Alınan	Toplam	Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen	Temmuz-Aralık Dönemi Finansman Tahmini	Yıl Sonu Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Oranı %
		Başlangıç	Yıl İçinde Yapılan İlave Planlama						
Tahsisi Mahiyette Nakit	90.731.691			46.209.460	136.941.151	136.941.151	51.339.573	188.280.724	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Gelirleri		100.000.000			100.000.000	55.765.776	55.836.052	111.601.828	111,6
Borçlanma		10.000.000			10.000.000		15.000.000	15.000.000	150,0
Ek Gelir (Serbest Nakit)			19.500.000		19.500.000	19.500.000		19.500.000	100,0
Finansman Toplamı	90.731.691	110.000.000	19.500.000	46.209.460	266.441.151	212.206.928	122.175.625	334.382.552	100,0
Tahsisi Mahiyette Ödenekler/Giderler	78.881.479			46.209.460	125.090.940	52.340.706	62.567.589	114.908.295	100,0
Özel İdare Kaynaklı Bütçe Ödenekleri/Giderleri	11.850.211	102.000.000	19.500.000		133.350.211	49.447.274	60.113.958	109.561.233	82,2
Borç Ödeme		8.000.000			8.000.000	4.460.971	3.515.515	7.976.486	99,7
Ödenekler/Giderler Toplamı	90.731.691	110.000.000	19.500.000	46.209.460	266.441.151	106.248.951	126.197.062	232.446.014	72,9
Finansman Dengesi						105.957.976	-4.021.437	101.936.539	

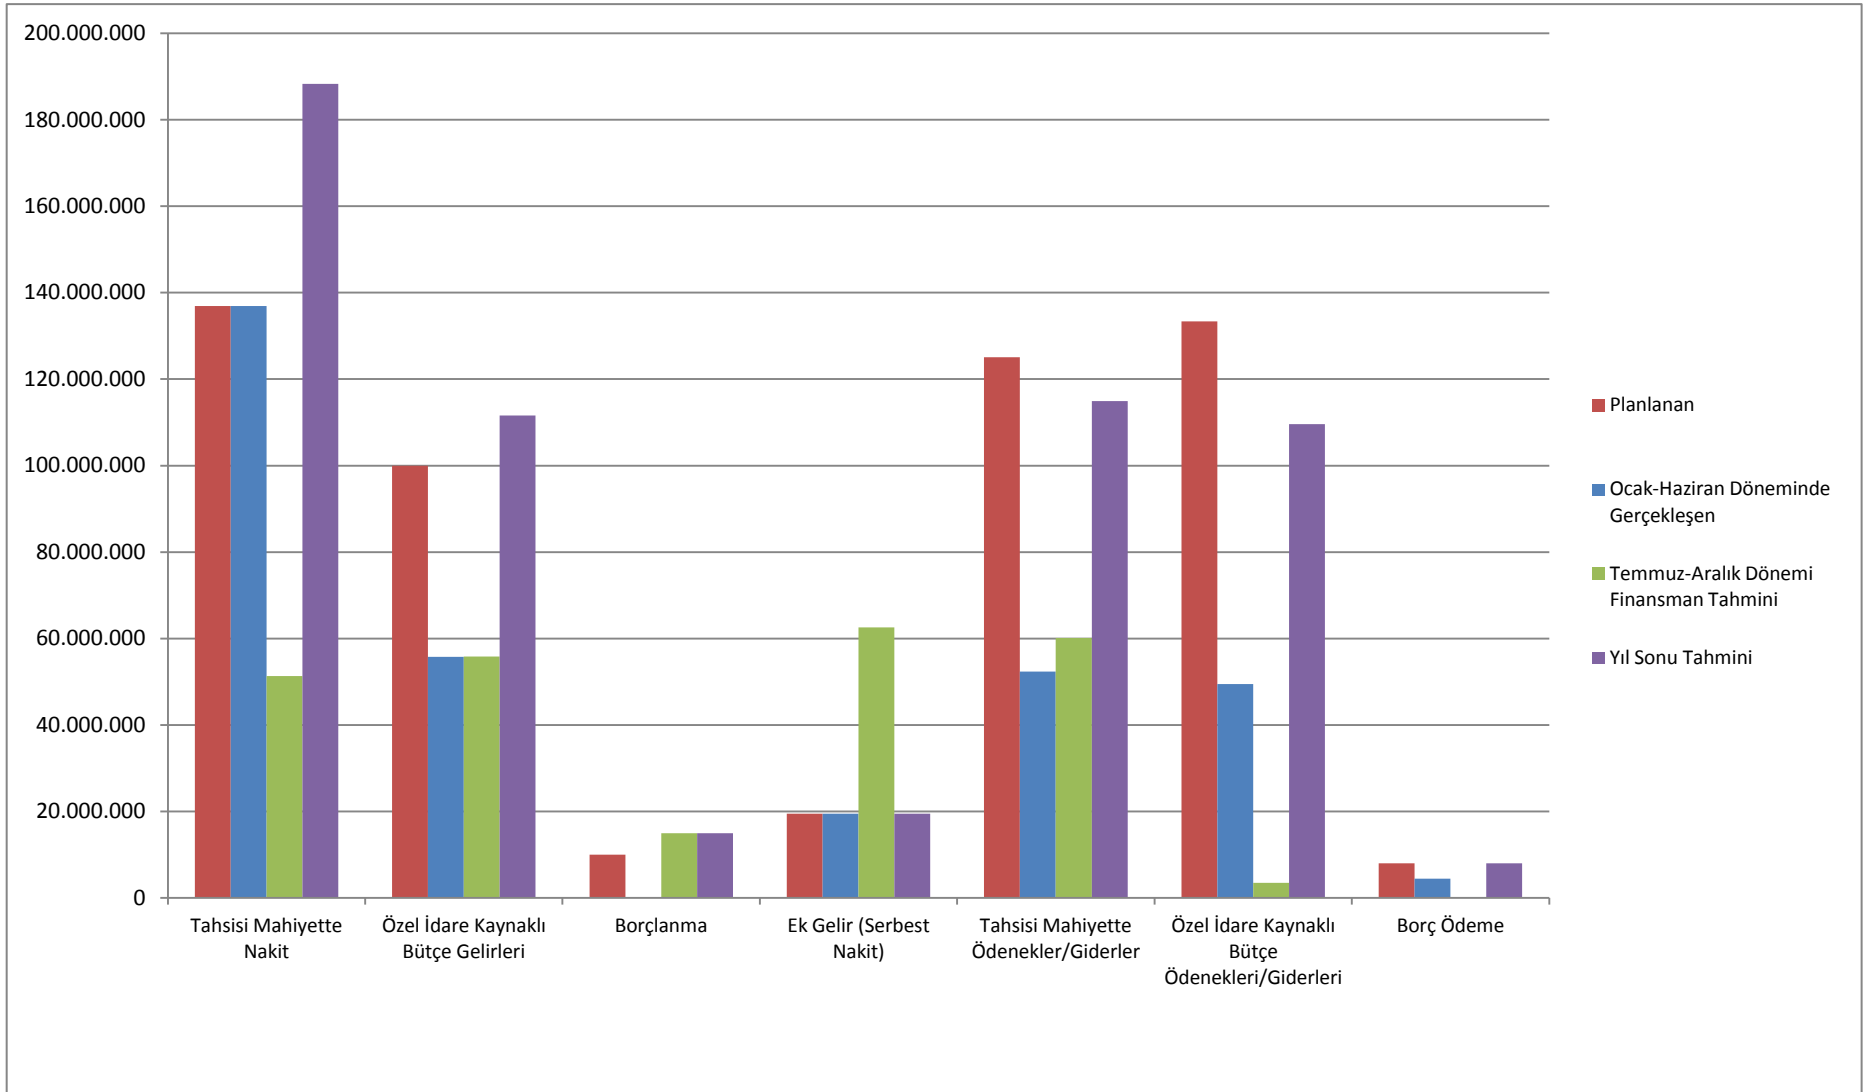

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A-Devam Edecek Projeler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	I. Kat Asfalt Kaplama (8 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	1.075.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	II. Kat Asfalt Kaplama (40 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	3.225.600,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.06.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	BSK Kaplama (31 Proje)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	16.179.200,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.05.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Yılsonu itibarıyla 31 projenin tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Bitümlü Sıcak karışım kaplama (BSK) çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ihtiyacı Akaryakıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	4.800.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2018 – 31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	2.300.000,00 TL. Ödeneğe ihtiyaç vardır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Bitümlü Sıcak karışım kaplama (BSK) ve I. ve II. Kat Sathi Kaplama ve Stabilize çalışmalarında çalıştırılacak Asfalt Plent Opr. Finişer Opr. ve Silindir Opr. Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018 – 31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım (Yama)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Performans Hedefi (1.2.2.1.)’nde belirtilen 1000 km asfalt küçük onarım çalışması yılsonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Asfalt Küçük Onarım Çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ihtiyacı Akaryakıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İktisadi - Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	1.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018 – 31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Büz ve Menfez Yapımı (Sanat Yapıları)
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	300.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Trafik İşaret Levha Çalışmaları
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	200.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Gülevler Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	934.137,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%53
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%53
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma yapılamayan %47'lik kısım için dava açıldı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Muzaffer Türkeş Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	3.411.587,23 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%84
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%84
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma çalışmaları %84 tamamlandı. Kamulaştırma yapılamayan %16'lık kısmı ile ilgili Dava açılması için İl Özel İdaresine hazırlanan dosya gönderildi.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) TEDAŞ Onayı Ve Bağlantı Antlaşması İmzalanması
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	22.420,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Nakdi (Parasal) Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İş Devam Ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İdareimiz hizmet birimlerine bilgisayar yazılımı alımları
Yeri	ISPARTA
Sektörü	DKH-İktisadi-Gen.İda.
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	100.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%80
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	İdareimiz hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılım ve lisansların temini
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar idareimizin ihtiyaç duyduğu yazılımların alımlarını yapmak

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Atabey Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.653.920,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	16 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi Yapımı
Yeri	Şarkıkaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.599.200,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2015-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Gelendost Anaokulu Yapımı.
Yeri	Gelendost Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.326.960,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Çünür 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.830.961,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Halikent 24 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.938.400,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Modernevler 24 Derslikli Gazi Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez.
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.621.172,13 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare/Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	12 Derslikli Ortaokulu Yapımı
Yeri	Sütçüler Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	5.574.320,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Şehit Süleyman Kalkan 12 Derslikli Ortaokulu Yapımı.
Yeri	Yalvaç Sücüllü
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.810.685,53 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Merkez Gülevler Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	934.137,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2014-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%53
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%53
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma yapılamayan %47'lik kısım için dava açıldı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Muzaffer Türkeş Mah. Temel Eğitim Alanı Kamulaştırması
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Okul Alanı Kamulaştırılması
Maliyeti	3.411.587,23 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%84
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%84
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	1.1:Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Kamulaştırma çalışmaları %84 tamamlandı. Kamulaştırma yapılamayan %16'lık kısmı ile ilgili Dava açılması için İl Özel İdaresine hazırlanan dosya gönderildi.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Birliklere Yardım
Yeri	Isparta Merkez ve İlçe Köyleri
Sektörü	DKH-SY-Diğer
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	820.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Ödeneğin tamamının merkez ve ilçe köylere gönderilmesi planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Keçiborlu Hükümet Konağı Yapım İşi
Yeri	Keçiborlu
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	8.211.285,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	09.01.2016-28.06.2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%85
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%85
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Sözleşmeye göre iş tamamlanma tarihi 28.06.2019'dur.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Sarem Limnolojik Araştırmalar Merkezi Yapım İşi
Yeri	Eğirdir
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	12.380.560,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	05.09.2017-01.05.2020
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	01.05.2020 tarihinde işin tamamlanması öngörülmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	9. Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Anıt Mezarı Yapım İşi
Yeri	Atabey
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	7.544.920,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	13.12.2017-10.06.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İşin tamamlanması öngörülmektedir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Davraz Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Yeni Mekanik Tesis Yapımı ve Havai Enerji Nakil Hatlarının Yeraltına Alınması İle Ek Trafo Tesislerinin Yapılması İşi
Yeri	Isparta-Davraz
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	42.362.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	23.02.2018-23.01.2020
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı
Yeri	Isparta il bütünü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	218.300,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2011-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%60
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	<p>07.02.2012 tarihinde işe başlanılmıştır. I. Aşama tamamlandı. II. Aşamaya geçildi. İhale bedeli 185.000,00 TL uzatılmış süreye göre işin bitiriliş tarihi 18.05.2013'tür. Alt ölçekli planların Üst ölçekli plan ve plan hükümlerine göre yapılması zorunlu olup, Çevre ve Şehircilik Bak. 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur-Isparta ÇDP, 20.05.2014 tarihinden askıdan indirilmiştir.07.09.2015-06.10.2015 tarihleri arası III. askı yapılmıştır. bu durum İdareimizce değerlendirilecektir. bu nedenle 1/25000 ÇDP idareimizce 21.02.2013 tarihinde durdurulmuş olup, İŞ DEVAM EDİYOR.</p> <p>(Ayrıca Bakanlığın görüş, öneri ve direktifleri doğrultusunda işlemlere devam edilecektir. İşin kalan süresi 86 Takvim günüdür.)</p> <p>1/100.000 ölçekli ÇDP'nin kesinleşmesi akabinde taslak plan, İl Genel Meclisi ve Isparta Belediye Meclisine sunuldu. Belde Belediyelerinin görüşleri İl Genel Meclisi tarafından yeniden alındı. Düzeltmeler yapıldı Mayıs 2017 meclisince değişiklikler istendi. İş devam ediyor.</p>

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı I. Grup Isparta İli Merkez-Atabey-Gönen-Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(55 Köy)
Yeri	Merkez-Atabey-Gönen-Keçiborlu-Uluborlu-Senirkent İlçelerine Bağlı Köyleri (55 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.552.467,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı II. Grup Isparta İli Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(71 Köy)
Yeri	Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köyleri(71 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.648.932,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı IV. Grup Isparta İli Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(37 Köy)
Yeri	Yalvaç İlçesine Bağlı Köyler(37 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.601.326,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Süçüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi
Yeri	Yalvaç/Süçüllü Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	105.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	24.05.2018 tarihinde askıya çıktı. İtirazlar değerlendiriliyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Özgüney - Özbayat İlave Revizyon İmar Planı
Yeri	Yalvaç/Özgüney - Özbayat
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Mecliste onaylandı ve imar planı kesinleşti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Eğirdir İlçesi Barla Köyü 5334 Parselde Bulunan Yapı İçin Rölöve, Restorasyon Elektrik Ve Makina Projeleri Hazırlanması İşi
Yeri	Eğirdir İlçesi Barla Köyü
Sektörü	Eğitim-Kültür
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	38.940,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel idare
Amacı	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) İmar Planı Yapımı
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	19.765,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İmar planı askıda iş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) TEDAŞ Onayı Ve Bağlantı Antlaşması İmzalanması
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	ENERJİ
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	22.420,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İş devam ediyor.

B- Yeni Başlayan Proje ve Faaliyetler

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Köprü Bakım Onarım Çalışması
Yeri	Merkez ve İlçe Köy Yolları
Sektörü	Ulaştırma, Altyapı
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım, Hizmet
Maliyeti	389.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	01.01.2018-31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması.
Açıklama	Yıl içerisinde belirlenecek bakım ve onarım çalışması gerektiren köprülerimizde çalışmalarımız yapılacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	I. ve II. Kat Sathi Kaplama ve Stabilize çalışmalarında kullanılan İş Makinaları ve Taşıtlar ihtiyacı Akaryakıt Alımı
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İKT- Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	2.500.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	10.07.2018 – 31.12.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.2: Ekonomik ve sosyal gelişimin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Fele (Yassibel) Köyü Sulama Tesisi Elektromotopompları İçin Frekans Kontrol Ünitesi İle Kıyakdede Köyü Sulama Tesisine Yatay Milli Elektromotopomp ve Frekans Kontrol Ünitesi Alımı ve Yerine Takılması Yapım İşi.
Yeri	Şarkikaraağaç İlçesi Fele (Yassibel) Köyü
Sektörü	Şarkikaraağaç İlçesi Kıyakdede Köyü
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	TARIM-Sulama
Maliyeti	Mal
Başlama - Bitiş Tarihi	140.420,00 TL
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdare
Amacı	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Açıklama	01.06.2018 tarihinde ihalesi yapıldı. 06.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalandı.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı İşi.
Yeri	Merkez
Sektörü	TARIM-Sulama
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	172.364,64 TL
Başlama - Bitiş Tarihi	06.07.2018 - 06.08.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	2.1: Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması
Açıklama	07.05.2018 tarihinde ihalesi yapıldı. 06.07.2018 tarihinde sözleşmesi imzalandı.

Proje veya faaliyet	
Adı	Aksu Zindan Mağarası Çevre Düzenlemesi
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	315.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2020
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%50
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	20.12.2017 tarihinde ihalesi yapılmış, 03.01.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, iş devam etmektedir

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon
Yeri	Isparta
Sektörü	Turizm
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.000.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2017-2020
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 16
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 16
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.6:Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması
Açıklama	Antalya Koruma Kurulunca Yalvaç Pisidia Antiokheia Antik Kentinde Bulunan Batı Kapısının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Statik Projelerinin hazırlanması işi tamamlandıktan sonra ihalesi yapılacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kurum Genel Arşivinin Oluşturulması
Yeri	İdaremiz İnşaat Ambarı Binası
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal / Hizmet / Yapım
Maliyeti	800.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2019 Yılları
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%70
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%50
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	5.2 Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması
Açıklama	Kurum merkez arşivinin Arşiv Yönetmeliğinde belirtilen standartlara uygun hale getirilerek Bilgi Güvenliği sağlanacaktır. Bu kapsamda; Öncelikle personel şahsi dosyalarının bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla e-arşiv sistemine alınması sağlanacaktır. Mevcut fiziki arşivin yönetmelikte belirtilen standartlara uygun hale getirilebilmesi için onarımı yapıldıktan sonra, kompakt raylı dolabı alınarak monte edilecek ve bu sayede daha kolay ulaşılabilir ve güvenli bir arşiv sistemi kurulacaktır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Kara Taşıt Alımları
Yeri	Merkez
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal Alımı
Maliyeti	750.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	16.07.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	% 100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	% 100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	4.1.İsparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	1 adet Asfalt Distribütörü alımı iptal edilerek yerine toplam 500.000,00 TL bedelli 2 Ad. Şasi Üzerine Çöp Toplama Aracı (T13) alımı yapılabilmesi için tahsis değişikliğine gidilmiştir.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İdaremiz hizmet birimlerine bilgisayar alımları
Yeri	ISPARTA
Sektörü	DKH-İKT-Genel İdare
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	180.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%56
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%56
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	4.1. Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	2018 yılı sonuna kadar kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla bilgisayar ve bilgisayar donanımı alımı yapılması planlanmaktadır.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Süçüllü Köyü Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşİ
Yeri	Yalvaç/Süçüllü Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	105.610,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	24.05.2018 tarihinde askıya çıktı. İtirazlar değerlendiriliyor. İş devam ediyor

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Özel İdaresi Gelendost Madenli Güneş Enerji Santrali (GES) İmar Planı Yapımı
Yeri	Gelendost Madenli
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	19.765,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.8: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi.
Açıklama	İmar planı askıda iş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Özgüney - Özbayat İlave Revizyon İmar Planı
Yeri	Yalvaç/Özgüney - Özbayat
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet alımı
Maliyeti	64.546,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2016-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	Mecliste onaylandı ve imar planı kesinleşti.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Barla Köyü Revizyon İmar Planı Hazırlanması Hizmet Alım İşi
Yeri	Barla Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kırsal Alan Planlaması
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet
Maliyeti	168.530,93 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%0
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İhale yapıldı. Sözleşme aşamasında.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı II. Grup Isparta İli Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(71 Köy)
Yeri	Aksu-Eğirdir-Sütçüler İlçelerine Bağlı Köyleri(71 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.648.932,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı III. Grup Isparta İli Gelendost-Şarkikaraağaç-Yenişarbademli İlçelerine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(40 Köy)
Yeri	Gelendost-Şarkikaraağaç-Yenişarbademli ilçeleri köyler(40 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.852.060,74 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%70
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İhale aşamasında

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	2018 Yılı IV. Grup Isparta İli Yalvaç İlçesine Bağlı Köylerine Kilit Parke Taşı Alımı İşi(37 Köy)
Yeri	Yalvaç İlçesine Bağlı Köyler(37 Köy)
Sektörü	DKH-SY-Şehirleşme
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal alımı
Maliyeti	1.601.326,08 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.1: Yerleşim yerlerinde mekânsal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması
Açıklama	İş devam ediyor.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Muhtelif Köylerin İçme Suyu Depolarına Tam Otomatik Klorlama Sistemi Mal Alım İşi
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Mal
Maliyeti	129.281,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	28.05.2018-26.07.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Gelendost, Çaltı, Madenli ve Yalvaç Yağcılar, Hisarardı Köyleri Depo Tadilatı
Yeri	Gelendost İlçesi Çaltı, Madenli ve Yalvaç Yağcılar, Hisarardı Köyleri
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	112.880,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	Sözleşme aşamasında.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta İli Muhtelif Köylerin İçme Suyu Şebeke Pompasına Güneş Enerjili Sistem Kurulması
Yeri	Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köyleri
Sektörü	DKH-SY-İçme Suyu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	462.560,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.3:Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması
Açıklama	Sözleşme aşamasında.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Gelendost Çaltı Köyü İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı
Yeri	Gelendost İlçesi Çaltı Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	80.166,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	03.07.2018-31.08.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	Isparta Aksu Yakaafşar Köyü İlave Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi
Yeri	Aksu İlçesi Yakaafşar Köyü
Sektörü	DKH-SY-Kanalizasyon
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	116.599,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	Özel İdare
Amacı	1.7: Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması.
Açıklama	Sözleşme aşamasında.

Proje veya faaliyet bilgileri	
Adı	İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Yeri	Isparta
Sektörü	Kamu
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Hizmet Alımı
Maliyeti	25.000,00 TL
Başlama – Bitiş Tarihi	15.08.2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%100
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.)	İl Özel İdaresi
Amacı	4.1.Isparta İl'inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi
Açıklama	5902 Sayılı Kanununun 18. Maddesine göre ilin tehlike ve risklerin görevi ve 7269 Sayılı Kanun gereği yapılacak iş ve işlemler İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze verilmiştir. Kaya düşmesi modellemesi (üç boyutlu arazi modellemesi) işi yapımı

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	24 Derslikli Mesleki ve Teknik Lisesi ve Atölye Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	12.900.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%45
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	05.07.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	TOBB Atölye Yapımı
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.700.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%40
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%40
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	300 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Şarkikaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	9.000.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	16 Derslikli İmam Hatip Lisesi ve 100 Öğrencilik Pansiyon Yapımı
Yeri	Şarkikaraağaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	14.400.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%25
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%25
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	30.07.2018 tarihinde ihale edilecek olup, 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Anadolu Lisesi, 200 Öğrenci Pansiyon ve Spor Salonu Yapımı
Yeri	Uluborlu Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	22.000.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2020
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%5
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%10
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	Spor Salonu Yapımı
Yeri	Yalvaç Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.400.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%35
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%35
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	28.06.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Çünür Anaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.850.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık/Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Gülistan Anaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	1.850.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık/Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli İstiklal Anaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.371.800,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık/Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	28.05.2018 tarihinde ihale dilmış olup 2018 yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Selçuklu Anaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.286.840,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık/Özel İdare
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	24.05.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	12 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Senirkent Büyükkabaca
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	6.250.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%20
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%20
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	8 Derslikli İlkokulu Yapımı
Yeri	Yalvaç Kozluçay
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	4.900.000,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2019
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%25
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%25
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	İl Özel İdare / Bakanlık
Amacı	1.5:Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	26.07.2018 tarihinde ihale edilecek olup 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Proje veya Faaliyet Bilgileri	
Adı	4 Derslikli Yedişehitler Anaokulu Yapımı.
Yeri	Isparta Merkez
Sektörü	Eğitim
Türü (Mal/Hizmet/Yapım)	Yapım
Maliyeti	2.339.940,00 TL
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018
Yıl Sonu Nakdi (Parasal) Gerçekleşme Tahmini	%80
Yıl Sonu Fiziki Gerçekleşme Tahmini	%100
Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/Bakanlık vs.)	Bakanlık/Özel İdare
Amacı	1.5: Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması
Açıklama	25.05.2018 tarihinde ihale edilmiş olup 2018 yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

V- EKLER

